


417	2023	42
	4	9

工 作 专 报

第 19 期

浦东新区生态环境局（水务局、海洋局、绿化市容局）
上海浦东发展（集团）有限公司
2023 年 3 月 17 日

报：桂  同志。 请区政府办安排协调。 3.21

关于举办浦东新区海滨资源再利用中心项目 1 号机组 点火并网仪式的报告

海滨资源再利用中心项目（以下简称“海滨项目”）作为上海市重大工程，是全市实现原生生活垃圾“零填埋”目标的重点工程，同时也是新区实现垃圾末端处置设施“东西联动”的重要一环。目前，我们正

区府办
秘书处

3.21 廖立生同志，浦东新区生态环境局、浦发集团、区政府（联络办）、浦东新区环保局。

在紧张有序推进项目建设和试运行准备，单线（2#锅炉带 1#汽机）已基本具备投运条件，将于 3 月下旬实现单线点火并网。现将有关推进情况报告如下：

一、项目总体进展

一是项目红线内部分（主要包含红线内土建、安装及取退水工程施工范围）：土建主体工程已完成约 90%，全厂道路管网已完成 80%，正在推进相关消缺完善工作。安装工程已完成约 90%，锅炉、汽机、烟气净化等主要设备安装已基本完成。

二是项目红线外部分（主要包含取退水工程场外取水口、箱涵、退水管部分及配套工程）：配套取退水工程完成约 60%，取水口、箱涵全部施工完成启用；项目利用海滨污水厂部分尾水作为冷却水，取水管道 3 月底贯通；顶管工程全部结束预计 6 月底完成；此外，临时接入海滨污水处理厂过渡管也已施工完成，正在进行循环泵调试等。

三是配套工程建设情况：项目相关配套工程中，拱极东路扩宽工程已通车、项目冷却水取水工程-中港河已通水、35kV 临时电力外线已具备并网条件。220kV 正式电力外线由国网市电力公司正在推进建设中，预计 6 月底施工完成。

按照建设计划，海滨项目于今年 3 月底前单线点火试运行、6 月底全面建成投运。

二、单线点火并网准备情况

目前，2#炉带 1#机整套系统已于 2 月 28 日完成电力质监，相关整改工作均已完成；3 月 8 日，首车垃圾进场，目前已实现连续进场；3 月 13 日，已召开整套启动验收委员会首次会议。目前，2#炉带 1#机已

具备整套启动条件，配套临时电力上网和取退水工程已完成。

三、举办项目单线点火并网仪式设想

海滨项目是全市本轮规划建设的多座垃圾焚烧厂的收官项目，按照计划，3月底能够实现一条线试运行节点目标，为4月实现御桥焚烧厂功能调整和垃圾物流替代奠定基础，促进周边居住环境改善和金色中环区域开发建设，项目投运具有重要意义。为此，我们建议初定在3月23日（周四）上午9时于海滨项目举办单线点火并网仪式，邀请区委、区府和市绿化市容局主要领导莅临现场出席仪式（见附件方案）。

特此报告。

附件：海滨资源再利用中心1号机组整套启动并网仪式方案

浦东新区生态环境局

2023年3月17日

（联系人：熊胜春 联系电话：18116080101）

附件 1:

海滨资源再利用中心 1 号机组整套启动 并网仪式方案

根据海滨资源再利用中心建设和试运行筹备情况，结合项目计划 3 月底实现一条线投运节点，制定单线机组点火并网仪式方案如下：

一、时间

2023 年 3 月 23 日（待定）上午 09:00 时。

（3 月底，项目仍在施工期间，同时，能够实现一条线点火并网试运行，可以为接下来御桥焚烧厂功能调整和垃圾物流替代奠定基础。）

二、地点

浦东新区海滨资源再利用中心中央控制室

三、拟出席领导

上海市委常委、浦东新区区委书记朱芝松

上海市政府副秘书长、浦东新区区长杭迎伟

市绿化市容局局长邓建平、总工程师朱心军、巡视员缪钧

浦东新区副区长毕桂平

四、出席范围

1. 市绿化市容局

2. 市重大办

3. 新区发改委

4. 新区生态局

- 5. 新区规资局
- 6. 新区建交委
- 7. 新区财政局
- 8. 老港镇政府
- 9. 新区重大办
- 10. 浦发集团
- 11. 浦发环保

五、日程安排

时间	地点	内容
09: 00 – 09: 30	海滨项目现场	视察海滨资源再利用中心建设情况
09: 30 – 9: 50	海滨项目中央控制室	1 号机组整套启动并网仪式

六、行车路线安排

区政府出发（8：00）—右转—→丁香路—左转—→桃林路—右转—→杨高中路—左转—→罗山路立交桥—龙东高架路—→环东二大道立交—→外环高速—→华夏西路立交—→华夏高架路—→迎宾高速—→申嘉湖高速—→两港公路（拱极东路出口）—左转—→拱极东路—→浦东新区海滨资源再利用中心。所有车辆停止中控大厅楼下道路东侧。

七、视察海滨资源再利用中心（30 分钟）

与会领导视察海滨资源再利用中心建设情况。

路线为：下车后步行至大厅（一楼）→参观互动区域（二楼，介绍项目总体情况）→锅炉区域→烟气处理区域→汽机区域。视察结束后原路返回至中央控制室（二楼）。

八、海滨项目 1 号机组整套启动仪式议程（20 分钟）

会议主持：海滨项目建设单位（浦发热电）

地点：中央控制室

09: 30 建设单位（浦发热电）宣布海滨资源再利用中心项目 1 号机组整套启动并网仪式正式开始,介绍与会领导;

09: 35 建设单位（浦发热电）简单介绍海滨项目基本情况;

09: 40 与会领导讲话;

09: 45 生产单位（浦发热电）再次确认是否具备并网条件,请示领导是否可以并网,芝松同志宣布正式并网,现场领导共同按并网按钮。

9: 50 仪式结束

10:45 桂平同志视察御桥焚烧厂技改工程进展情况。

附件:


- 1、 海滨项目首条线并网仪式路线图
- 2、 海滨项目人车分流路线图

上海浦发热电能源有限公司

2023 年 3 月 17 日


附图 1:

浦东新区海滨资源再利用中心项目
首条线并网仪式路线图

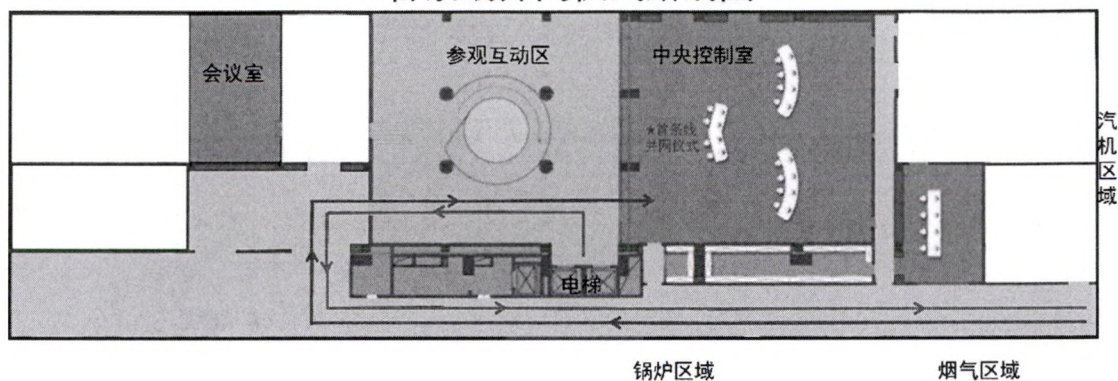

附图 2:

垃圾车进厂人车分流路线图

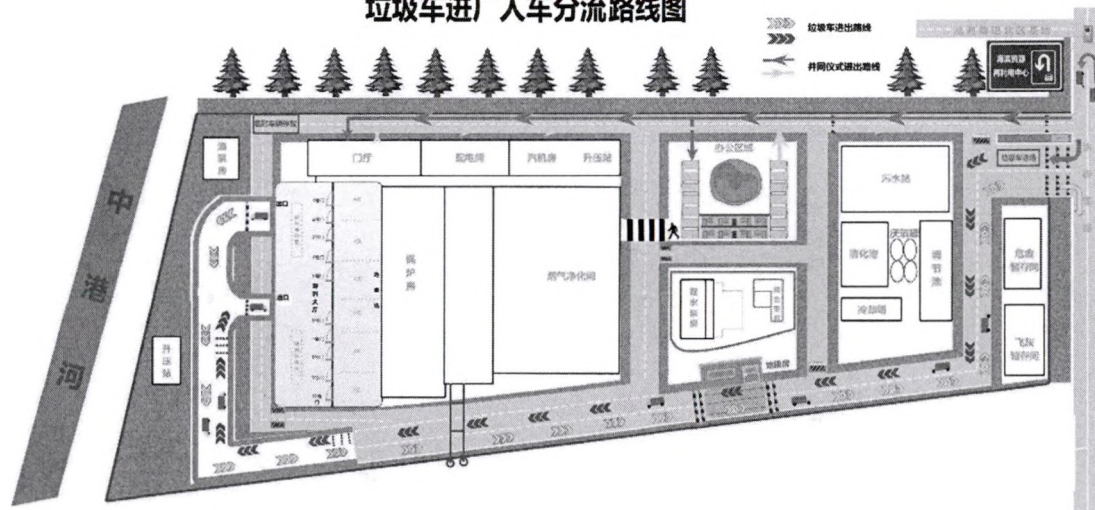

生态环境局工作专报拟文稿

标 题	关于举办浦东新区海滨资源再利用中心项目点火并网仪式的报告		
专报部门	浦东生态环境局机关-市容环卫处(垃圾分类工作处)	专 报 人	金晓蓉
专报日期	2023-03-17	文 号	19
事 由	<p>海滨资源再利用中心项目作为上海市重大工程，是全市实现原生生活垃圾“零填埋”目标的重点工程，同时也是新区实现垃圾末端处置设施“东西联动”的重要一环。目前，我们正在紧张有序推进项目建设和试运行准备，单线（2#锅炉带 1#汽机）已基本具备投运条件，将于 3 月下旬实现单线点火并网；项目将于 6 月底全面建成投运。现将有关推进情况形成工作专报报告区领导，请各位领导审阅。{金晓蓉[2023/3/17 10:15:02]}</p> <p>海滨资源再利用中心项目作为上海市重大工程，是全市实现原生生活垃圾“零填埋”目标的重点工程，同时也是新区实现垃圾末端处置设施“东西联动”的重要一环。目前，我们正在紧张有序推进项目建设和试运行准备，单线（2#锅炉带 1#汽机）已基本具备投运条件，将于 3 月下旬实现单线点火并网；项目将于 6 月底全面建成投运。现将有关推进情况形成工作专报报告区领导，请各位领导审阅。{金晓蓉[2023/3/17 10:15:02]}</p>		
主管领导 签发意见	同意。{康永良[2023/3/21 12:50:28]}	分管领导 会签意见	拟同意。{薛加良[2023/3/17 13:52:55]}
办公室审 核 意 见	<p>已核。{徐小花[2023/3/17 12:47:49]}</p> <p>已核。请加良同志审核，请永良同志审核并签发。{高瑞莲[2023/3/17 13:45:22]}</p>	会签部门 意 见	
专报部门 意 见	拟同意{高文安[2023/3/17 12:42:55]}		

备 注	<p>该工作专报拟由我局和浦发集团联合专报，浦发集团正在线下同步走会签程序，我处先行发起专报流程，后续将浦发集团签好字的会签单补在附件中。{金晓蓉[2023/3/17 10:15:02]}</p> <p>该工作专报拟由我局和浦发集团联合专报，浦发集团正在线下同步走会签程序，我处先行发起专报流程，后续将浦发集团签好字的会签单补在附件中。{金晓蓉[2023/3/17 10:15:02]}</p>
-----	---
